

**ACUERDO ESPECÍFICO PARA LA RESCISIÓN DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS  
DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN ENTRE  
EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO  
Y  
LA PROVINCIA DE CATAMARCA**

Entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA, representado por su Administrador Lic. Bernardo Bartolomé HEREDIA (D.N.I. N° 29.714.914), con domicilio en Av. Corrientes N° 1750 Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el "ENOHSA", y la PROVINCIA DE CATAMARCA, representada en este acto por el Gobernador, Lic. Raúl Alejandro JALIL, (D.N.I. N° 16.283.466), con domicilio en la calle Av Presidente Castillo esquina Viuda de Varela, San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, en adelante la "LA PROVINCIA", y conjuntamente denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente ACUERDO ESPECÍFICO PARA LA RESCISIÓN DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN, en adelante el "ACUERDO ESPECÍFICO", y

**CONSIDERANDO:**

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto del ENOHSA aprobado como Anexo por el artículo 1° del Decreto N° 107/97 y su modificatorio, dicho organismo ejecutará las políticas formuladas por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS para el desarrollo de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento en general, a través de la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios y de la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliario y elementos y brindando asistencia técnica y financiera con destino a la construcción, mantenimiento, operación y reposición de Infraestructura, provisión de equipamiento y la operatividad y regulación de los sistemas prestacionales.

Que el artículo 7° del Estatuto citado precedentemente establece que son destinatarios de las actividades y acciones que ejecute el ENOHSA, entre otros, las Provincias y Municipalidades, a nivel de sus organismos centralizados, descentralizados, autárquicos y/o empresas o sociedades, o aquellas que bajo otra conformación jurídica, participen de la explotación, expansión, regulación y control de los servicios mencionados en el

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#EP

considerando precedente.

Que con fechas 18 de febrero de 2021 y 7 de julio de 2022, se suscribieron dos Convenios de Asistencia Financiera entre el ENOHSA y la PROVINCIA para la ejecución de varios proyectos en distintas localidades de la mencionada jurisdicción provincial.

Que, oportunamente, la PROVINCIA designó al MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE y a AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M. como Organismos Provinciales que actuarán como responsables de la gestión del financiamiento y/o ejecución de las Obras en la Provincia de Catamarca.

Que posteriormente, en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO - PROFESA-, se suscribieron CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN entre el ENOHSA y el MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE y a AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M. , mediante los cuales el ENOHSA se comprometió a brindar la asistencia financiera para la ejecución de las obras que se mencionan en el ANEXO I, las que serán financiadas por el ENOHSA con cargo al presupuesto correspondiente a su jurisdicción y en función a la disponibilidad presupuestaria.

Que habiéndose llevado a cabo los Procedimientos Licitatorios correspondientes a las obras que como tal se mencionan en el ANEXO I del presente, los ENTES EJECUTORES suscribieron Contratos de Obra Pública con las Contratistas y por las sumas que se indican en el ANEXO I, suscribiéndose las Actas de Inicio de Obra correspondientes.

Que, asimismo, se suscribieron Adendas a los citados CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN, conforme al detalle que se informa en el ANEXO I del presente.

Que por otra parte, por el artículo 1º del Decreto N° 70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, ante la severidad de la crisis que atraviesa el país, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico.

Que en dicho marco, con fecha 10 de junio de 2024 la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN suscribió con la PROVINCIA un ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS (en adelante, "ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN") por cuya CLÁUSULA PRIMERA las partes asumieron el compromiso de adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de que la PROVINCIA asuma la financiación y/o ejecución, según corresponda, de las obras

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

Página 2 de 22  
Página 2 de 22

## **El Poder Ejecutivo Provincial**

públicas que se detallan en el ANEXO I de dicho acuerdo cuya financiación y/o ejecución se encuentra actualmente a cargo de diversos entes del Sector Público Nacional.

Que, asimismo, en la CLÁUSULA SEGUNDA del ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN se acordó que lo dispuesto en la CLÁUSULA PRIMERA de dicho acuerdo se implementará a través de Acuerdos Específicos a suscribirse entre las autoridades competentes, en los que se especificarán las condiciones particulares para cada una de las obras.

Que LAS PARTES consideran pertinente rescindir los CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN, asumiendo la PROVINCIA la financiación y/o ejecución de las obras detalladas en el ANEXO I del presente.

Que, en el marco de lo expuesto, en esta instancia resulta necesario suscribir el ACUERDO ESPECÍFICO aludido en la CLÁUSULA SEGUNDA del ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN, sujeto a las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA:** LAS PARTES acuerdan rescindir los CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN oportunamente suscriptos entre el ENOHSa y los ENTES EJECUTORES designados por la PROVINCIA para la ejecución de las Obras que se detallan en el ANEXO I del presente. En consecuencia, a partir de la suscripción del presente ACUERDO ESPECÍFICO, la PROVINCIA asume la asistencia financiera, para la ejecución de las Obras que se detallan en el ANEXO I del presente (en adelante "LAS OBRAS"), de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA PRIMERA del ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN, debiendo para ello efectuar todos los procedimientos legales y administrativos que resulten necesarios para continuar con la ejecución de LAS OBRAS.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Se deja establecido que el avance físico de cada una de LAS OBRAS surge del ANEXO I del presente donde consta, además, el estado técnico de las mismas.

**CLÁUSULA TERCERA:** El monto total transferido por el ENOHSa por cada una de LAS OBRAS hasta la fecha de suscripción del presente ACUERDO ESPECÍFICO surge del detalle del ANEXO II. La rendición de cuentas respecto de dichos montos fue efectuada por la PROVINCIA, en el marco de lo previsto en el artículo 11 del REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS,

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSa

## *El Poder Ejecutivo Provincial*

MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES aprobado como Anexo por el artículo 1° de la Resolución N° 19/20 del ex MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus modificatorias.

La PROVINCIA asume el compromiso de abonar a las Contratistas de cada una de LAS OBRAS, a partir de la suscripción del presente, el monto pendiente de pago hasta la finalización y recepción definitiva de LAS OBRAS.

El porcentaje de Anticipo Financiero no descontado de los certificados emitidos y presentados al ENOHSA, hasta la fecha de la suscripción del presente ACUERDO ESPECÍFICO, y que como tal surge del ANEXO II, será considerado como un aporte del financiamiento por parte del GOBIERNO NACIONAL a fin de garantizar la continuidad de la ejecución de LAS OBRAS, ello en el marco de la cooperación y colaboración que debe primar entre LAS PARTES conforme surge del ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN. En dicho contexto, el ENOHSA se reserva la facultad de auditar técnica y financieramente en cualquier momento LAS OBRAS a fin de garantizar que los citados fondos transferidos sean aplicados a la ejecución de la misma.

Asimismo, la PROVINCIA asume la obligación de presentar al ENOHSA los certificados de avance de obra y los comprobantes que los respaldan, a los fines de acreditar el efectivo uso de los fondos transferidos oportunamente en concepto de Anticipo Financiero para cada una de LAS OBRAS.

En caso de que alguna de LAS OBRAS no sea finalizada, la PROVINCIA se compromete a devolver al ENOHSA el porcentaje de Anticipo Financiero no rendido, el cual deberá actualizarse conforme a la Tasa Activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

**CLÁUSULA CUARTA:** La PROVINCIA se compromete a adoptar todas las medidas administrativas, técnicas y financieras que considere necesarias para dar operatividad y ejecutoriedad al presente. En caso de incumplimiento el ENOHSA podrá solicitar la devolución de los fondos oportunamente transferidos.

**CLÁUSULA QUINTA:** La PROVINCIA se compromete a mantener indemne al ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios como consecuencia de la rescisión del presente ACUERDO ESPECÍFICO y/o ejecución de LAS OBRAS y renuncia a todo crédito y/o reclamo (administrativo o judicial) que la PROVINCIA se crea con derecho a formular y que se encuentre relacionado de manera directa o indirecta con los CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN y su ejecución, lo cual sin limitaciones y al solo efecto ejemplificativo incluye: créditos y/o reclamos por

IP-2025-00511232-CA1-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

daños y perjuicios y/o por mayores costos y/o por gastos improductivos y/o por obras no certificadas y/o por la teoría de la imprevisión y/o por la redeterminación de precios y/o por todo otro gasto, directo o indirecto, en que haya tenido que incurrir la PROVINCIA en el marco de dichos Convenios, manifestando la PROVINCIA expresamente que no mantiene ninguna pretensión vigente al día de la fecha para con el ENOHSA en el marco de los CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN.


**CLÁUSULA SEXTA:** Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales.

De no poder resolver la controversia de común acuerdo, LAS PARTES la someterán a consideración de los tribunales con competencia en razón de la materia con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** LAS PARTES fijan los domicilios indicados en el encabezado del presente a todos sus efectos, resultando válidas todas las notificaciones que en su consecuencia allí se efectúen.

**CLÁUSULA OCTAVA:** LAS PARTES entienden y aceptan que, a partir de la suscripción del presente, quedan automáticamente y de pleno derecho sin vigencia, los Convenios Específicos de Cooperación y Financiación que se detallan a continuación:

1. Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de las Obras "PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS – LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA".
2. Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra "PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS - LOC. DE SAUJIL".
3. Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra "SISTEMA DESAGÜES CLOACALES - FIAMBALA – DEPARTAMENTO DE TINOGASTA".
4. Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra "ACUEDUCTO VALLE VIEJO" en la localidad de VALLE VIEJO.
5. Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra "RED CLOACAL - COLECTOR OESTE II" Departamento CAPITAL.




IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA


**El Poder Ejecutivo Provincial**

6. Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra "CLOACAS CAPITAL" – San Fernando del Valle de Catamarca.
7. Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra "REFUNCIONALIZACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA" – Villa Piriquitas – Departamento Fray Mamerto Esquiú.

En consecuencia, LAS PARTES no se deben importe o indemnización alguna por ningún concepto, correspondiendo a LA PROVINCIA el financiamiento de las mencionadas Obras, en los términos indicados en las CLÁUSULAS precedentes.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Bs As a los 26 días del mes de noviembre de 2024.

  
Lic. RAÚL A. JALIL  
GOBERNADOR DE CATAMARCA

  
Lic. Beatriz Bustos Mora  
Administrador  
Ente Nacional de Obras Hídricas de Buenos Aires

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

**ANEXO I**

Estado de Obras Financiadas por el ENOHSA conforme el ANEXO I del ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS suscripto entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y la PROVINCIA DE CATAMARCA. (CONVE-2024-61493313-APN-SOP#MEC).

**1) ACUEDUCTO VALLE VIEJO - CATAMARCA**

*Id de la Obra: 131481 (SIPPE)*

**Expediente:** EX-2022-18691924- -APN-ENOHSA#MOP

**Financiamiento:**

Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la obra ACUEDUCTO VALLE VIEJO – LOCALIDAD DE VALLE VIEJO – PROVINCIA DE CATAMARCA

- Ente ejecutor: AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M
- CONVE-2022-71711023-APN-AJ#ENOHSA (13/07/2022)
- Plazo: 690 días
- Ampliaciones: 150 días
- Plazo total: 840 días
- Vencimiento: 30/10/2024
- Monto de Financiamiento: \$ 536.147.428,67

**Addendas:**

- CONVE-2023-07855503-APN-AJ#ENOHSA (20/01/2023) – ampliación de monto por licitación, ampliación de plazo para inicio de obra y de plazo de vigencia de convenio

**Contrato (IF-2023-21360349-ENOHSA#MOP):**

- Contratista HUASI CONSTRUCCIONES S R L
- Monto: \$ 918.026.879,78
- Fecha de firma: 14/02/2023
- Modificaciones aprobadas: NO


**Plazo de ejecución:**

- Inicio de obra: 13/03/2023
- Plazo: 450 días
- Ampliaciones de plazo: 0 días
- Plazo total: 450 días
- Fecha de fin de contrato: 05/06/2024


**Porcentaje de Avance físico aprobado:** 53.79%

**Redeterminaciones de precios**

- Sin redeterminaciones aprobadas



IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA



## El Poder Ejecutivo Provincial

### 2) SISTEMA DESAGÜES CLOACALES - FIAMBALA - DTO. TINOGASTA - CATAMARCA

Id de la Obra: 131985 (SIPPE)

Expediente: EX-2021-68506655- -APN-ENOHSA#MOP

#### Financiamiento:

Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la obra SISTEMA DESAGÜES CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE FIAMBALA – DEPARTAMENTO TINOGASTA – PROVINCIA DE CATAMARCA

Ente ejecutor: MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

- CONVE-2021-83504718-APN-AJ#ENOHSA (03/09/2021)
- Plazo: 510 días
- Ampliaciones: 521 días
- Plazo total: 1031 días
- Vencimiento: 30/06/2024
- Monto de Financiamiento: \$ 311.039.326,61

#### Addendas:

- CONVE-2022-15562207-APN-AJ#ENOHSA (17/02/2022) – ampliación de monto por licitación, ampliación de plazo para Inicio de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-76493942-APN-AJ#ENOHSA (04/07/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-122750388-APN-AJ#ENOHSA (17/10/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-146377910- APN-AJ#ENOHSA (07/12/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio

#### Contrato (IF-2022-45855076-APN-ENOHSA#MOP):

- Contratista HUASI CONSTRUCCIONES S R L
- Monto: \$ 367.326.071,95
- Fecha de firma: 22/04/2022
- Modificaciones aprobadas: NO

#### Plazo de ejecución:

- Inicio de obra: 02/05/2022
- Plazo: 270 días
- Ampliaciones de plazo: 360 días
- Plazo total: 630 días
- Fecha de fin de contrato: 22/01/2024

Porcentaje de Avance físico aprobado: 95,91%

#### Redeterminaciones de precios

- Aprobadas: \$ 659.104.491,53
- Adecuación Provisoria N° 12 – mayo 2023

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA



## El Poder Ejecutivo Provincial

### 3) RED CLOACAL - COLECTOR OESTE II - SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - CATAMARCA

Id de la Obra: 131500 (SIPPE)

Expediente: EX-2021-35388163- -APN-ENOHSA#MOP

#### Financiamiento:

Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la obra RED CLOACAL - COLECTOR OESTE II – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CATAMARCA

- Ente ejecutor: AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M
- CONVE-2021-59011434-APN-AJ#ENOHSA (01/07/2021)
- Plazo: 420 días
- Ampliaciones: 379 días
- Plazo total: 799 días
- Vencimiento: 08/09/2023
- Monto de Financiamiento: \$ 214.006.936,40

#### Addendas:

- CONVE-2021-91288539-APN-AJ#ENOHSA (23/09/2021) – ampliación de monto por licitación
- CONVE-2021-126197365-APN-AJ#ENOHSA (28/12/2021) – ampliación de plazo para inicio de obra
- CONVE-2023-01928271-APN-AJ#ENOHSA (05/01/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio

#### Contrato (IF-2021-112212404-APN-ENOHSA#MOP):

- Contratista JAG CONSTRUCCIONES S A
- Monto: \$ 276.060.852,00
- Fecha de firma: 18/10/2021
- Modificaciones aprobadas: NO

#### Plazo de ejecución:

- Inicio de obra: 13/12/2021
- Plazo: 180 días
- Ampliaciones de plazo: 375 días
- Plazo total: 555 días
- Fecha de fin de contrato: 10/10/2023

Porcentaje de Avance físico aprobado: 81.52%

#### Redeterminaciones de precios

- Sin redeterminaciones aprobadas



IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

Página 9 de 22  
Página 9 de 22

**4) PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS - LOC. DE SAUJIL - CATAMARCA**

**Id de la Obra:** 131182 (SIPPE)

**Expediente:** EX-2021-26825260- -APN-ENOHSA#MOP

**Financiamiento:**

Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la obra PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS - LOCALIDAD DE SAUJIL – PROVINCIA DE CATAMARCA

- Ente ejecutor: MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
- CONVE-2021-62867447-APN-AJ#ENOHSA (13/07/2021)
- Plazo: 510 días
- Ampliaciones: 502 días
- Plazo total: 1012 días
- Vencimiento: 20/04/2024
- Monto de Financiamiento: \$ 104.865.658,02

**Addendas:**

- CONVE-2022-01324728-APN-AJ#ENOHSA (30/12/2021) – ampliación de monto por licitación, ampliación de plazo para inicio de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2022-67808360-APN-AJ#ENOHSA (04/07/2022) – ampliación de plazo para inicio de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-76490323-APN-AJ#ENOHSA (04/07/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-102441540-APN-AJ#ENOHSA (31/08/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-146309128-APN-AJ#ENOHSA (07/12/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio

**Contrato (IF-2022-45098190-APN-ENOHSA#MOP):**

- Contratista ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.
- Monto: \$ 135.251.409,12
- Fecha de firma: 18/04/2022
- Modificaciones aprobadas: NO

**Plazo de ejecución:**

- Inicio de obra: 22/04/2022
- Plazo: 270 días
- Ampliaciones de plazo: 330 días
- Plazo total: 600 días
- Fecha de fin de contrato: 13/12/2023

**Porcentaje de Avance físico aprobado:** 96.17%

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

## El Poder Ejecutivo Provincial

### Redeterminaciones de precios

- Aprobadas: \$ 252.797.577,40
  - Adecuación Provisoria N° 12 -- mayo 2023

### 5) ANCASTI - CATAMARCA - PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS

Id de la Obra: 130969 (SIPPE)

Expediente: EX-2020-66275648- -APN-ENOHSA#MOP

### Financiamiento:

Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la obra PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS – LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA – PROVINCIA DE CATAMARCA

- Ente ejecutor: MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
- CONVE-2020-77106409-APN-AJ#ENOHSA (10/11/2020)
- Plazo: 600 días
- Ampliaciones: 585 días
- Plazo total: 1185 días
- Vencimiento: 08/02/2024
- Monto de Financiamiento: \$ 99.553.910,55

### Addendas:

- CONVE-2021-33827027-APN-AJ#ENOHSA (19/04/2021) – actualización de presupuesto
- CONVE-2021-103238880-APN-AJ#ENOHSA (17/10/2021) – ampliación de monto por licitación y ampliación de plazo de para inicio de obra.
- CONVE-2021-121708893-APN-AJ#ENOHSA (13/12/2021) – ampliación de plazo de para inicio de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-19907669-APN-AJ#ENOHSA (23/02/2023) – ampliación de monto por redeterminación, de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio
- CONVE-2023-72587248-APN-AJ#ENOHSA (26/06/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra
- CONVE-2023-139024774-APN-AJ#ENOHSA (22/11/2023) – ampliación de plazo de ejecución de obra y de plazo de vigencia de convenio

### Contrato (IF-2021-117726254-APN-ENOHSA#MOP):

- Contratista ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.
- Monto: \$ 147.980.646,58
- Fecha de firma: 17/11/2021
- Modificaciones aprobadas: NO

### Plazo de ejecución:

- Inicio de obra: 19/11/2021
- Plazo: 360 días

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

Página 11 de 22  
Página 11 de 22

- Ampliaciones de plazo: 275 días
- Plazo total: 635 días
- Fecha de fin de contrato: 16/08/2023

**Porcentaje de Avance físico aprobado: 71,56%**

**Redeterminaciones de precios**

- Aprobadas: \$ 202.086.375,28
  - Redeterminación de Precios N° 13 – diciembre 2022

**6) VILLA PIRIQUITAS - DPTO. FRAY M. ESQUIU - CATAMARCA - REFUNCIONALIZACION DE PLANTA POTABILIZADORA**

*Id de la Obra: 131535 (SIPPE)*

**Expediente:** EX-2021-35387984 -APN-ENOHSA#MOP

**Financiamiento:**

Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la obra VILLA PIRIQUITAS - DPTO. FRAY M. ESQUIU - CATAMARCA - REFUNCIONALIZACION DE PLANTA POTABILIZADORA

- Ente ejecutor: AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M
- CONVE-2021-59008614-APN-AJ#ENOHSA
- Plazo: 352 días
- Ampliaciones: 186 días
- Plazo total: 538 días
- Vencimiento: 21/07/2022
- Monto de Financiamiento: \$ 154.948.553,34

**Addendas:**

- CONVE-2021-111719346-APN-AJ#ENOHSA - (19/10/2021) Plazo Inicio Ejecución de Obra
- CONVE-2022-77911375-APN-AJ#ENOHSA (28/07/2022) Plazo Vigencia del Convenio, y Plazo Inicio Ejecución de Obra

**Contrato (IF-2021-116179983-APN-ENOHSA#MOP):**

- Contratista ISACONS CONSTRUCCIONES
- Monto: \$ 185.806.930,08
- Fecha de firma: 19/11/2021
- Modificaciones aprobadas: NO

**Plazo de ejecución:**

- Inicio de obra: 27/12/2021
- Plazo: 112 días
- Ampliaciones de plazo: 186 días
- Plazo total: 298 días

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

## El Poder Ejecutivo Provincial

- Fecha de fin de contrato: 21/10/2022

**Porcentaje de Avance físico aprobado:** 63,64 %

### Redeterminaciones de precios

- Sin Redeterminaciones Aprobadas

## 7) CATAMARCA - CLOACAS CAPITAL - DEPTO. VALLE VIEJO

*Id de la Obra:* 132160 (SIPPE)

**Expediente:** EX-2022-18649989- -APN-ENOHSA#MOP

### Financiamiento:

Convenio Específico de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la obra CLOACAS CAPITAL - DEPTO. VALLE VIEJO

- Ente ejecutor: AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M
- CONVE-2022-71731243-APN-AJ#ENOHSA
- Plazo: 540 días
- Ampliaciones: 150 días
- Plazo total: 690 días
- Vencimiento: 01/06/2024
- Monto de Financiamiento: \$310.356.507,43

### Addendas:

- o CONVE-2023-17818360-APN-AJ#ENOHSA

### Contrato (IF-2023-21351143-APN-ENOHSA#MOP):

- Contratista ARIDOS DEL VALLE S.R.L
- Monto: \$634.380.597,70
- Fecha de firma: 22/02/2023
- Modificaciones aprobadas: NO

### Plazo de ejecución:

- Inicio de obra: 21/03/2023
- Plazo: 300 días
- Ampliaciones de plazo: 0 días
- Plazo total: 300 días
- Fecha de fin de contrato: 15/01/2024

**Porcentaje de Avance físico aprobado:** 88,97 %

### Redeterminaciones de precios

- Sin redeterminaciones aprobadas

Se deja constancia que la información vertida en este Informe, surge de la documentación remitida oportunamente por los entes ejecutores, en calidad de Declaración Jurada.

IF-2023-00511233-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

El Poder Ejecutivo Provincial

ANEXO II - PROFESA CATAMARCA - ESTADO SITUACION PAGOS Y ANTICIPO FINANCIERO DE OBRAS

EXREMIENTE	LOCALIDAD	NOMBRE	TOTAL PAGADO	ANTICIPO FINANCIERO OTORGADO	ANTICIPO PENDIENTE DE DESGLENTO
EX-2020-66275648-APN-ENOHSA#MOP	ANCASTI	ANCASTI - CATAMARCA - PLANTA DEPURADORA DE EFUENTES CLOACALES	139,209,019.36	44,394,193.97	12,623,821.64
EX-2021-26825260-APN-ENOHSA#MOP	SAUJIL	SAUJIL - CATAMARCA - PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA - VILLA PIRIQUITAS - DPTO. FRAY M. ESQUIU - CATAMARCA - REFUNCIÓNALIZACION	167,802,334.75	40,575,422.74	5,437,764.79
EX-2021-35387984-APN-ENOHSA#MOP	FRAY MAMERTO		138,519,758.33	55,742,079.02	20,265,930.75
EX-2021-35388163-APN-ENOHSA#MOP	SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA	SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - CATAMARCA - RED CLOACAL			
EX-2021-6850555-APN-ENOHSA#MOP	VALLE DE CATAMARCA	COLECTOR-OESTE II	240,357,286.12	82,818,255.10	15,301,527.51
EX-2021-18649989-APN-ENOHSA#MOP	FIAMBALA	FIAMBALA - CATAMARCA - SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES	441,716,491.03	110,197,821.58	6,993,732.33
EX-2022-18691924-APN-ENOHSA#MOP	SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA	CATAMARCA - CLOACAS CAPITAL - DEPTO. VALLE VIEJO	190,314,179.31	190,314,179.31	190,314,179.31
	VALLE VIEJO	ACUEDUCTO VALLE VIEJO - CATAMARCA	275,408,063.93	275,408,063.93	275,408,063.93

IF-2024-00511232-CAT-DA#SD  
 CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

**El Poder Ejecutivo Provincial**

PROGRAMA: PROFESA EXPEDIENTE: 66275848/2020  
 PROVINCIA: CATAMARCA SIPPE: 130989  
 LOCALIDAD: ANCASTI  
 EJECUTOR: MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
 OBRA: ANCASTI - CATAMARCA - PLANTA DEPURADORA DE EF.LUENTES CLOCALES DOMICILIARIOS  
 CONTRATISTA: ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.

Carificado	Periodo	Fecha Ingreso	Aprob. Técnica	Aprob. Financiera	Fecha Devengamiento	Fecha pago	Transferido ENOHSa
AF 1		12/02/2021		12/02/2021	31/07/2020	12/02/2021	29.868,173.16
AF 2		23/11/2021		31/01/2022	31/05/2021	03/02/2022	12.489,818.89
						03/02/2022	2.058,201.92
Obra 1	11/2021	17/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	760,721.03
Obra 2	12/2021	22/03/2022	25/03/2022	26/03/2022	26/04/2022	16/05/2022	4.740,476.00
Obra 3	1/2022	23/03/2022	24/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	13/08/2022	25.523,860.44
Obra 4	2/2022	15/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	23/08/2022	3.217,885.19
Obra 5	5/2022	12/08/2022	24/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	1.365,314.74
Obra 6	4/2022	09/09/2022	24/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	9.888,531.55
Obra 7	5/2022	31/10/2022	24/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	7.530,826.86
Obra 8	6/2022	31/10/2022	25/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	4.619,061.86
Obra 9	7/2022	01/11/2022	26/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	6.188,183.05
Obra 10	8/2022	24/11/2022	26/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	984,794.07
Obra 11	9/2022	22/12/2022	26/01/2023	01/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	681,553.27
Obra 12	10/2022	01/01/2023	26/01/2023	15/03/2023	30/03/2023	03/05/2023	4.316,371.77
Obra 13	11/2022	08/02/2023	27/04/2023	21/06/2023	13/07/2023	20/07/2023	1.347,524.03
Obra 14	12/2022	09/03/2023	27/04/2023	21/06/2023	13/07/2023	20/07/2023	870,825.02
Obra 2 Redel 1 D	12/2021	25/04/2023	26/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	16/08/2023	626,766.49
Obra 3 Redel 2 D	1/2022	25/04/2023	17/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	08/09/2023	3.100,376.10
Obra 4 Redel 3 D	2/2022	25/04/2023	17/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	08/09/2023	761,674.77
Obra 6 Redel 4 D	3/2022	25/04/2023	17/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	08/09/2023	323,828.90
Obra 14 Redel 4 D	12/2022	25/04/2023	17/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	08/09/2023	6.382,728.86
Obra 15	1/2023	22/05/2023	23/08/2023	28/08/2023	08/09/2023	12/09/2023	424,268.68
Obra 16	2/2023	09/06/2023	23/08/2023	28/08/2023	08/09/2023	12/09/2023	427,441.40
Obra 6 Redel 5 D	4/2022	12/06/2023	19/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	575,957.12
Obra 11 Redel 10 D	9/2022	12/09/2023	19/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	422,121.84
Obra 10 Redel 9 D	8/2022	12/08/2023	19/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	485,160.33
Obra 8 Redel 7 D	9/2022	12/06/2023	19/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	876,383.12
Obra 7 Redel 6 D	5/2022	12/06/2023	19/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	719,895.89
Obra 9 Redel 8 D	7/2022	12/06/2023	19/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	2.414,348.76
Obra 12 Redel 11 D	10/2022	12/08/2023	19/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	2.287,449.07
Obra 13 Redel 12 D	11/2022	12/08/2023	19/10/2023	24/10/2023	17/11/2023	23/11/2023	1.084,741.12

Total Pagado: 139,208,019.36  
 Anticipo Financiero Otorgado: 44,394,193.97  
 Anticipo Pendiente de Descuento: 12,623,521.64

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
 CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSa

# El Poder Ejecutivo Provincial

**PROGRAMA:** PROFESA **EXPEДИENTE:** 20225260/2021  
**PROVINCIA:** CATAMARCA **SIPPE:** 131182  
**LOCALIDAD:** SAUJIL  
**EJECUTOR:** MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
**OBRA:** SAUJIL - CATAMARCA - PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA -  
**CONTRATISTA:** ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.

Certificado	Periodo	Fecha Ingreso	Aprob. Técnica	Aprob. Financiera	Fecha Devengamiento	Fecha pago	Transferido ENOHS
AF 1		25/09/2021		02/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	31,499,897.41
AF 2		11/10/2022		12/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	9,115,726.33
Obra 1	2/2022	29/07/2022	08/12/2022	12/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	3,487,490.18
Obra 2	5/2022	08/08/2022	06/12/2022	12/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	4,708,711.57
Obra 4	7/2022	10/10/2022	07/12/2022	12/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	5,803,888.24
Obra 3	8/2022	28/08/2022	07/12/2022	12/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	6,978,685.15
Obra 5	8/2022	31/10/2022	07/12/2022	12/01/2023	03/03/2023	06/03/2023	7,582,601.39
Obra 6	8/2022	08/11/2022	07/12/2022	12/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	1,549,946.44
Obra 7	10/2022	10/12/2022	08/01/2023	12/01/2023	08/03/2023	10/03/2023	6,235,247.60
Obra 8	11/2022	24/01/2023	07/02/2023	15/02/2023	17/03/2023	03/05/2023	943,692.07
Obra 9	12/2022	06/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	13/04/2023	03/05/2023	404,118.98
Obra 10	1/2023	10/03/2023	11/07/2023	23/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	3,249,387.34
Obra 11	2/2023	28/03/2023	11/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	2,413,353.72
Obra 12	3/2023	17/05/2023	11/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	15,658,784.57
Obra 1 Redel 1 D	4/2022	08/05/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	998,402.09
Obra 3 Redel 3 D	6/2022	09/05/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	2,862,038.58
Obra 4 Redel 4 D	7/2022	09/05/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	3,226,982.02
Obra 6 Redel 6 D	9/2022	22/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	166,232.70
Obra 7 Redel 7 D	10/2022	22/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	1,189,791.87
Obra 8 Redel 8 D	11/2022	22/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	288,593.32
Obra 11 Redel 6 D	2/2023	09/05/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	15,354,825.41
Obra 11 Redel 8 D	2/2023	22/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	2,403,300.81
Obra 13	4/2023	31/05/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	4,304,909.28
Obra 13 Redel 8 D	4/2023	22/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	22,857,721.37
Obra 2 Redel 2 D	5/2022	09/05/2023	09/10/2023	12/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	1,859,351.85
Obra 14	5/2023	30/09/2023	09/10/2023	12/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	12,283,111.51
Obra 15	6/2023	04/09/2023	08/10/2023	12/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	1,711,804.89

**Total Pagado:** 167,802,334.75  
**Anticipo Financiero Otorgado:** 40,575,422.74  
**Anticipo Pendiente de Descuento:** 6,437,764.78

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
 CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHS



**El Poder Ejecutivo Provincial**

PROGRAMA: PROFESA EXPEDIENTE: 35387684/2021  
 PROVINCIA: CATAMARCA SIPPE: 131536  
 LOCALIDAD: FRAY MAMERTO ESQUIU  
 EJECUTOR: AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M  
 OBRA: VILLA PIRIQUITAS - DPTO. FRAY M. ESQUIU - CATAMARCA - REFUNCIONALIZACION DE PLANTA POTABILIZADORA  
 CONTRATISTA: ISACONS CONSTRUCCIONES

Carillicado	Periodo	Fecha Ingreso	Aprob. Técnica	Aprob. Financiera	Fecha Devengamiento	Fecha pago	Transferido ENOHS
AF 1		28/07/2021		28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	46,484,688.00
AF 2		30/11/2021		14/12/2021	14/12/2021	20/12/2021	9,257,513.02
Obra 1	1/2022	22/03/2022	23/05/2022	01/08/2022	03/08/2022	10/09/2022	30,287,482.14
Obra 2	2/2022	31/03/2022	24/05/2022	08/08/2022	09/08/2022	12/09/2022	5,388,288.76
Obra 3	3/2022	28/07/2022	17/08/2022	02/09/2022	08/09/2022	30/09/2022	11,472,109.24
Obra 4	4/2022	12/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	08/09/2022	30/09/2022	2,355,721.77
Obra 5	5/2022	11/08/2022	22/08/2022	02/09/2022	09/09/2022	30/09/2022	1,955,831.53
Obra 6	6/2022	23/08/2022	30/08/2022	14/10/2022	17/10/2022	27/10/2022	10,824,886.81
Obra 7	7/2022	08/10/2022	25/10/2022	02/11/2022	07/11/2022	05/01/2023	10,708,036.02
Obra 8	8/2022	18/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	07/11/2022	05/01/2023	9,989,324.04

Total Pagado: 136,618,786.33  
 Anticipo Financiero Otorgado: 55,742,078.02  
 Anticipo Pendiente de Descuento: 20,265,830.75

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
 CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHS

**El Poder Ejecutivo Provincial**

PROGRAMA: PROFESA EXPEDIENTE: 05305163/2021  
 PROVINCIA: CATAMARCA SIPPE: 131500  
 LOCALIDAD: SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA  
 EJECUTOR: AGUAS DE CATAMARCA S A P E M  
 OBRA: SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - CATAMARCA - RED CLOACAL - COLECTOR DESTE II  
 CONTRATISTA: JAG CONSTRUCCIONES S A

Cerificado	Periodo	Fecha Ingreso	Aprob. Técnica	Aprob. Financiera	Fecha Devengamiento	Fecha pago	Transferido ENOHS
AF 1		20/07/2021		20/07/2021	31/07/2020	20/07/2021	24.844.641.73
						29/07/2021	39.257.599.19
AF 2		20/12/2021		20/01/2022	21/01/2022	24/01/2022	18.810.174.18
Obra 1	1/2022	22/03/2022	01/06/2022	07/08/2022	08/08/2022	20/07/2022	13.924.821.88
Obra 2	2/2022	31/03/2022	01/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	20/07/2022	10.054.775.00
Obra 6	6/2022	29/09/2022	09/01/2023	12/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	38.503.288.05
Obra 7	7/2022	17/10/2022	09/01/2023	12/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	3.320.075.12
Obra 3	3/2022	03/08/2022	09/01/2023	11/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	5.607.727.10
Obra 4	4/2022	03/08/2022	09/01/2023	11/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	9.010.705.18
Obra 5	5/2022	11/08/2022	09/01/2023	11/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	22.493.127.49
Obra 8	8/2022	17/10/2022	09/01/2023	12/01/2023	03/03/2023	08/03/2023	3.440.304.92
Obra 9	9/2022	15/11/2022	09/01/2023	12/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	8.288.150.39
Obra 10	10/2022	28/12/2022	23/01/2023	01/02/2023	13/03/2023	03/05/2023	11.948.700.77
Obra 11	11/2022	27/01/2023	23/02/2023	03/03/2023	13/03/2023	03/05/2023	8.948.802.40
Obra 12	12/2022	09/03/2023	30/03/2023	19/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	5.554.109.99
Obra 13	1/2023	09/03/2023	30/03/2023	19/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	7.886.405.91
Obra 14	2/2023	19/04/2023	30/06/2023	19/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	3.278.987.91
Obra 15	3/2023	19/04/2023	30/06/2023	19/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	3.278.987.91

Total Pagado: 240.367.286.12  
 Anticipo Financiero Otorgado: 82.816.265.10  
 Anticipo Pendiente de Descuento: 18.301.827.51

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
 CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

# El Poder Ejecutivo Provincial

**PROGRAMA:** PROFESA **EXPEDIENTE:** 6800666/2021  
**PROVINCIA:** CATAMARCA **SIPPE:** 131986  
**LOCALIDAD:** FIAMBALA  
**EJECUTOR:** MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
**OBRA:** FIAMBALA - CATAMARCA - SISTEMA DE DESAGÜES CLOCALES  
**CONTRATISTA:** HUASI CONSTRUCCIONES S R L

Certificado	Periodo	Fecha Ingreso	Aprob. Técnica	Aprob. Financiera	Fecha Devengamiento	Fecha pago	Transferido ENOHS
AF 1		17/12/2021		21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	83,311,797.98
Obra 1	5/2022	28/09/2022	09/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	02/01/2023	3,240,731.08
Obra 2	6/2022	25/10/2022	06/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	05/01/2023	9,178,584.14
Obra 3	7/2022	25/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	05/01/2023	7,845,989.83
AF 2		19/10/2022		08/11/2022	18/11/2022	05/01/2023	18,880,023.60
Obra 4	8/2022	12/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	11/01/2023	53,213,202.19
Obra 5	9/2022	01/11/2022	10/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	17/01/2023	11,610,877.82
Obra 6	10/2022	14/11/2022	06/12/2022	28/12/2022	09/03/2023	18/04/2023	27,278,881.21
Obra 7	11/2022	04/01/2023	23/01/2023	31/01/2023	09/03/2023	10/03/2023	10,237,489.14
Obra 8	12/2022	30/01/2023	30/03/2023	19/04/2023	27/04/2023	03/05/2023	16,082,275.74
Obra 9	1/2023	24/02/2023	11/07/2023	26/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	25,975,433.93
Obra 10	2/2023	23/03/2023	21/07/2023	26/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	6,057,950.10
Obra 11	3/2023	21/04/2023	25/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	08/08/2023	11,413,807.02
Obra 12	4/2023	17/05/2023	25/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	08/08/2023	9,482,250.39
Obra 1 Redel 2 D	5/2022	12/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	1,109,133.42
Obra 2 Redel 3 D	6/2022	12/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	4,408,767.61
Obra 3 Redel 3 D	7/2022	15/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	4,082,793.44
Obra 4 Redel 3 D	8/2022	15/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	28,619,339.57
Obra 5 Redel 3 D	9/2022	18/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	6,730,393.97
Obra 6 Redel 3 D	10/2022	18/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	12,783,168.85
Obra 7 Redel 3 D	11/2022	18/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	4,893,205.87
Obra 8 Redel 3 D	12/2022	18/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	7,888,480.24
Obra 9 Redel 3 D	1/2023	18/05/2023	25/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	13,517,031.80
Obra 13	6/2023	30/08/2023	19/10/2023	28/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	8,218,627.81
Obra 14	6/2023	19/07/2023	20/10/2023	28/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	4,048,115.81
Obra 15	7/2023	24/08/2023	20/10/2023	28/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	21,845,584.78
Obra 11 Redel 4 P	3/2023	04/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	23/11/2023	1,497,955.34
Obra 9 Redel 4 P	1/2023	04/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	23/11/2023	3,492,332.53
Obra 5 Redel 4 P	9/2022	01/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	1,530,007.77
Obra 7 Redel 4 P	11/2022	01/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	1,353,735.02
Obra 11 Redel 3 D	3/2023	04/07/2023	10/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	5,389,804.84
Obra 6 Redel 4 P	10/2022	01/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	3,570,228.06
Obra 3 Redel 4 P	7/2022	01/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	1,054,868.21
Obra 8 Redel 4 P	12/2022	01/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	2,018,918.44
Obra 4 Redel 4 P	8/2022	01/09/2023	10/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	7,081,887.62

**Total Pagado:** 441,716,491.03  
**Anticipo Financiero Otorgado:** 110,197,821.88  
**Anticipo Pendiente de Descuento:** 8,893,732.33

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
 CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHS

# El Poder Ejecutivo Provincial


PROGRAMA: PROFESA EXPEDIENTE: 18846088/2022  
PROVINCIA: CATAMARCA SIPPE: 133100  
LOCALIDAD: SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA  
EJECUTOR: AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M  
OBRA: CATAMARCA - CLOACAS CAPITAL - DEPTO. VALLE VIEJO  
CONTRATISTA: ARIDOS DEL VALLE S.R.L

Certificado	Período	Fecha Ingreso	Aprob. Técnica	Aprob. Financiera	Fecha Devengamiento	Fecha pago	Transferido ENOHSA
AF 1		02/03/2023		13/03/2023	14/04/2023	22/05/2023	180,314,179.31

Total Pagado: 180,314,179.31

Anticipo Financiera Otorgado: 180,314,179.31

Anticipo Pendiente de Descuento: 180,314,179.31



IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHSA

**El Poder Ejecutivo Provincial**


PROGRAMA: PROFESA EXPEDIENTE: 10001024/2022  
PROVINCIA: CATAMARCA SIPPE: 131401  
LOCALIDAD: VALLE VIEJO  
EJECUTOR: AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M  
OBRA: ACUEDUCTO VALLE VIEJO- CATAMARCA  
CONTRATISTA: HUASI CONSTRUCCIONES S R L

Certificado	Periodo	Fecha Ingreso	Aprob. Técnica	Aprob. Financiera	Fecha Devengamiento	Fecha pago	Transferido ENOHS
AF 1		20/03/2023		27/03/2023	14/04/2023	22/08/2023	275,408,063.93

Total Pagado: 275,408,063.93  
Anticipo Financiero Otorgado: 275,408,063.93  
Anticipo Pendiente de Descuento: 275,408,063.93



IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-AJ#ENOHS

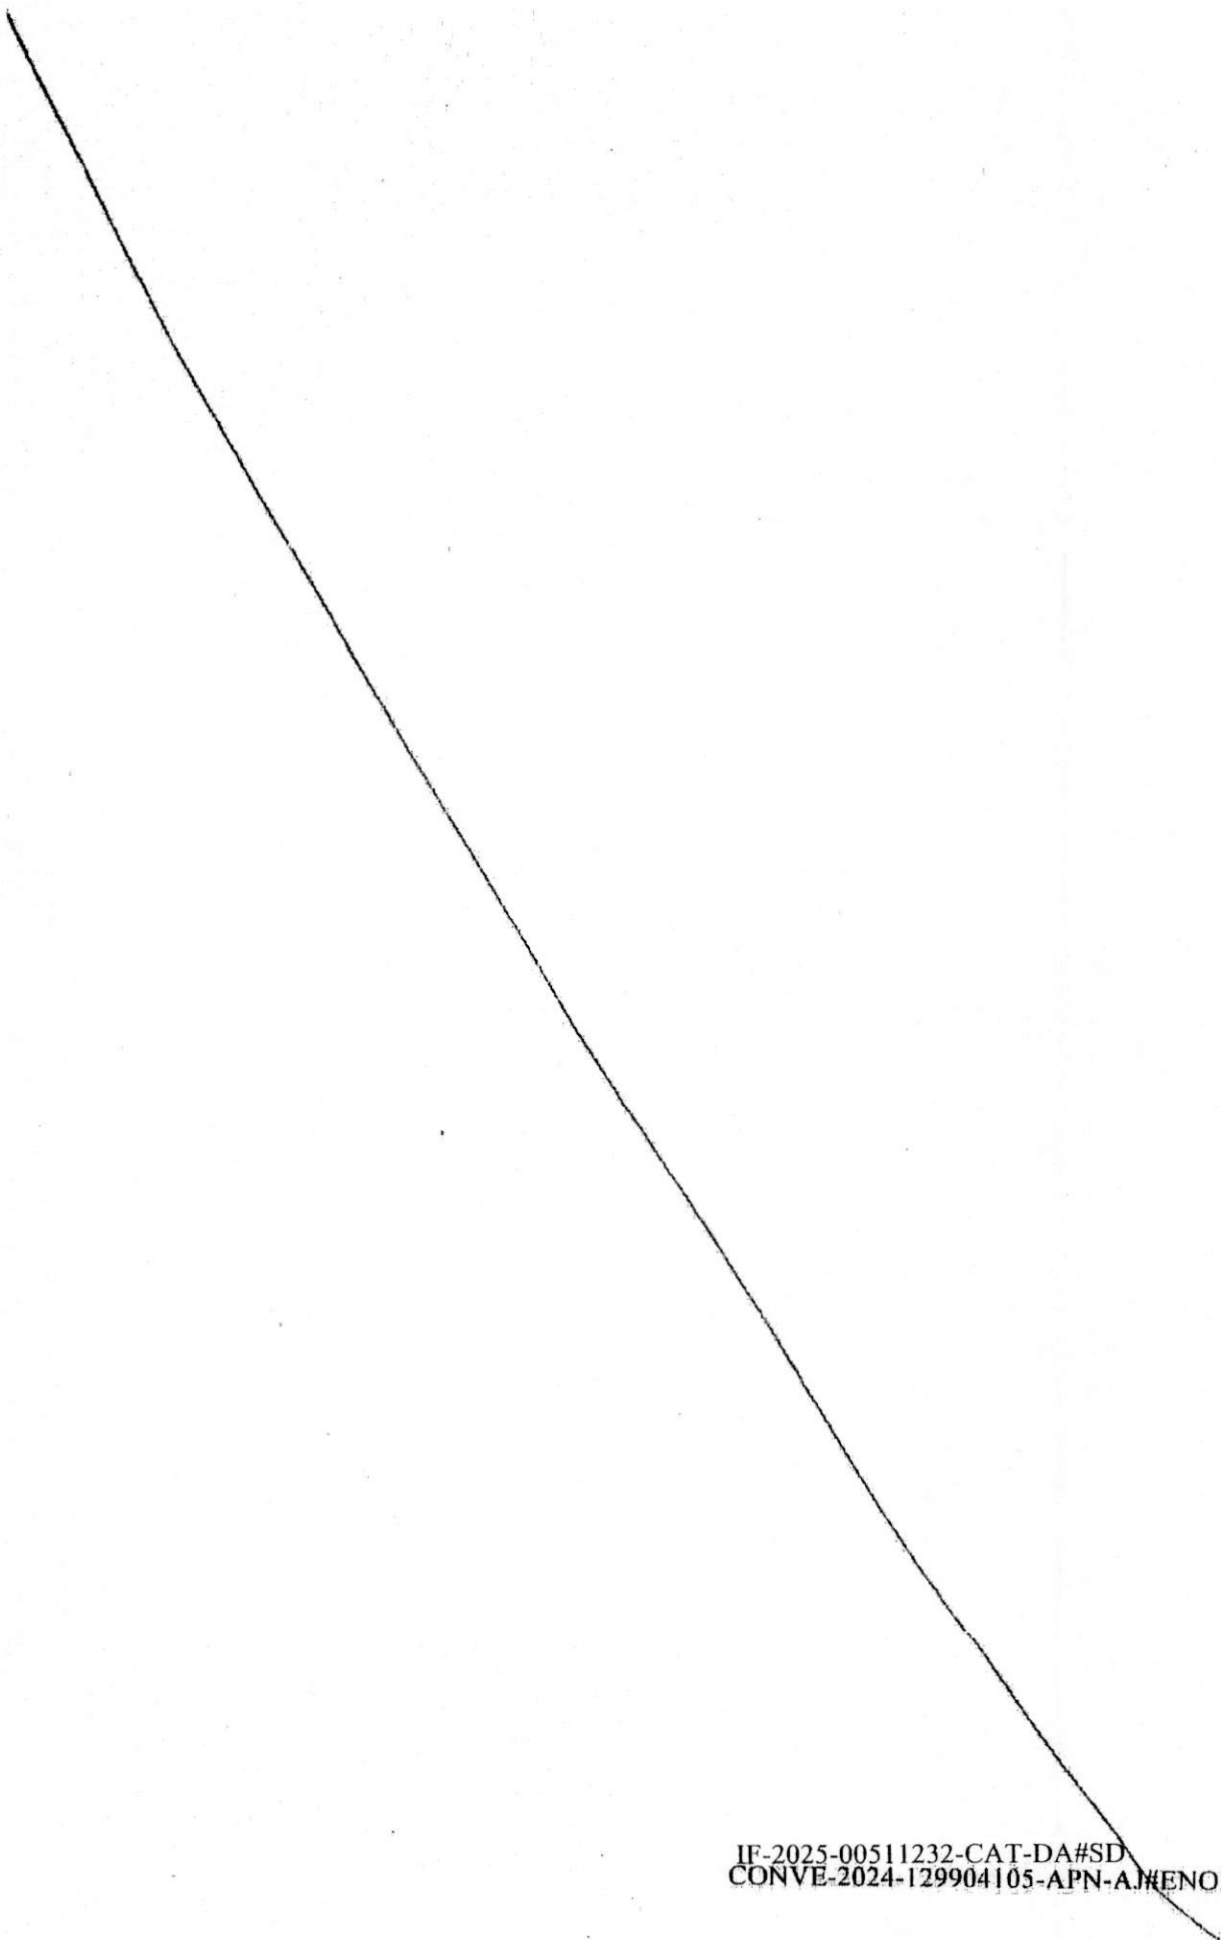

IF-2025-00511232-CAT-DA#SD  
CONVE-2024-129904105-APN-A.#ENOHSA
